



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016



Prefeitura de Rondolândia-MT
União, Trabalho e Participação



2a. MEDIÇÃO

PERÍODO:

31/07/2015 Á 09/12/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 131,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			2ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		VALOR A EXECUTAR
		UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	
14.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/BARRAMENTO, CHAPA DE AÇO, 4 DISJUNTOR UNIPOLAR + 8 BIPOLAR + 1 TRIPOLAR + 1 DR,	UN	1,00	387,3200100	387,32	-	-	-	387,32
14.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X32X95mm	UN	1,00	387,3200100	387,32	-	-	-	387,32
14.22	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 80mm (1")	m	22,00	14,4817050	318,60	-	-	-	318,60
14.23	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	m	32,00	12,8073750	409,84	-	-	-	409,84
14.24	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES 1.1/2"	m	22,00	23,4406200	515,69	-	-	-	515,69
14.25	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4" INCLUS BRACADEIRAS	M	86,00	21,9537150	1.888,02	-	-	-	1.888,02
14.26	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" INCLUS BRACADEIRAS	M	17,00	23,0157900	391,27	-	-	-	391,27
14.27	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1/2" INCLUS BRACADEIRAS	M	34,00	38,4471150	1.307,20	-	-	-	1.307,20
14.28	LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESC 2X40W, COMPLETA	UN	1,00	88,23	88,23	-	-	-	88,23
14.29	LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESC 1X40W, COMPLETA	UN	1,00	64,92	64,92	-	-	-	64,92
14.30	LUMINARIA BLINDADA P/ ALTA PRESSAO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR HERMETICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTA DE 500W COM PROTECAO DA LAMPADA	UN	15,00	251,5993200	3.773,99	-	-	-	3.773,99
SUBTOTAL					17.308,32				17.308,32
15	SPDA								
15.1	CAIXA DE INSPECAO 30X30X40 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00	145,867	729,34	-	-	-	729,34
15.2	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UN	12,00	19,330	231,96	-	-	-	231,96
15.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2	UN	24,00	44,295	1.063,08	-	-	-	1.063,08
15.4	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" 3M	UN	5,00	52,192	260,96	-	-	-	260,96
15.5	TUBO PVC 40 MM	UN	18,00	23,776	428,00	-	-	-	428,00
15.6	TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS	UN	5,00	12,595	62,98	-	-	-	62,98

Eng. Empresa

Fiscal

Arquiteto e Urbanista
CRAJ nº 37175-0

Fiscal
8/11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016



Prefeitura de Rondolândia-MT
União, Trabalho e Participação



2a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 31/07/2015 À 09/12/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

CONTRATO Nº: 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 131,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			2ª medição			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
		UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
SUBTOTAL					2.776,32					2.776,32
16	SERVICIOS DIVERSOS									
16.1	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG MALHA 2" REVEST PVC FIXA EM TUBOS DE FERRO GALVAN 2"	m2	147,00	117,3155550	17.245,39	-	-	-	147,00	17.245,39
16.2	PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME GALVANIZ FIO 12 BMG MALHA 2" REVEST PVC INCLUSO DOBRADICA E FECHADURA	UN	4,00	812,6123250	3.250,45	-	-	-	4,00	3.250,45
16.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA P/ LAVATORIO COM TESTEIRAS ESPESS. 2CM LARGURA 5CM CONF. PROJETO	M	4,80	467,5254150	2.244,12	-	-	-	4,80	2.244,12
16.4	BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM ARESTAS CONF. PROJETO	m	4,80	516,4163500	2.478,81	-	-	-	4,80	2.478,81
16.5	BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2" L=140CM LAVATORIO INC. FIXACAO E PINTURA	UN	2,00	197,2586650	394,52	-	-	-	2,00	394,52
16.6	BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" L=80CM BACIA SANITARIA E MICTORIO INC. FIXACAO E PINTURA	UN	8,00	182,6394150	1.461,12	-	-	-	8,00	1.461,12
16.7	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50	400,7771250	1.803,50	-	-	-	4,50	1.803,50
16.8	ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE	cj	1,00	920,2067700	920,21	-	-	-	1,00	920,21
16.9	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	cj	1,00	2.715,0135600	2.715,01	-	-	-	1,00	2.715,01
16.10	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLLEY	cj	1,00	1.149,1776450	1.149,18	-	-	-	1,00	1.149,18
16.11	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=15CM E=2CM	M	2,90	55,3153660	160,41	-	-	-	2,90	160,41
16.12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	861,56	2,0616750	1.776,26	-	-	-	861,56	1.776,26
SUBTOTAL					35.598,98					35.598,98
TOTAL RECURSO PRÓPRIO					907.634,56		31.027,21		83.279,33	824.355,03
RECURSO FUNASA					544.880,73					

Eng. Empresa

Fiscal

Fiscal
9/11

Rodrigo Sthorst e Sá
Arquiteto e Urbanista
CAO nº 175-0



2a. MEDIÇÃO

PERÍODO: **31/07/2015** À **09/12/2015**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 131,00

Item	DESCRÇÃO / DISCRIMINAÇÃO			PLANILHA CONTRATADA			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL			DIFERENÇA (EXECUTADO - PREVISTO)	
	UND	QTDE	UNITARIO	VALOR EXECUTADO	%	VALOR A EXECUTAR	2ª medição	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR		VALOR A EXECUTAR
EXECUÇÃO											
1ª medição		5,76%	52.252,170	94,24%	855.382,38		2ª medição	2,916%	26.469,55	25.782,61	
2ª medição		37,26%	31.027,210	90,82%	824.355,17			4,385%	39.795,74	8.768,53	
3ª medição									120.802,85		
4ª medição									145.165,864		
5ª medição									40.688,995		
6ª medição									496.336,282		
7ª medição									2.776,302		
8ª medição									35.598,96		
RESULTADO FINAL		43,02%	83.279,380	90,82%	824.355,17			7,30%	907.634,55	17.014,08	

JUSTIFICATIVA MEDIÇÃO:

RESUMO	
PROPOSTA CONTRATADA	907.634,55
VALOR DE ITENS ADITIVOS / PERMUTADOS	-
VALOR A SUPRIMIR	-
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	-
VALOR TOTAL CONTRATADO + ADITIVO DE SERVIÇOS- SUPRIMIDOS	907.634,55
VALOR MEDIDO MEDIANTE PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO DE SERVIÇOS	83.279,330
VALOR A SER EXECUTADO PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO DE SERVIÇOS EXECUTADO	824.355,03
VALOR A ACUMULADO MEDIANTE PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO DE SERVIÇOS	907.634,550

Andriago Silveira Leite
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A-37175-0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016



Prefeitura de Rondolândia-MT
União, Trabalho e Participação



2a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 31/07/2015 A 09/12/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

EMPRESA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME



CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 131,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL				
		UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	2ª medição	VALOR EXECUTADO	QTDE	VALOR ACUMULADO

Evolução da Obra em Valores

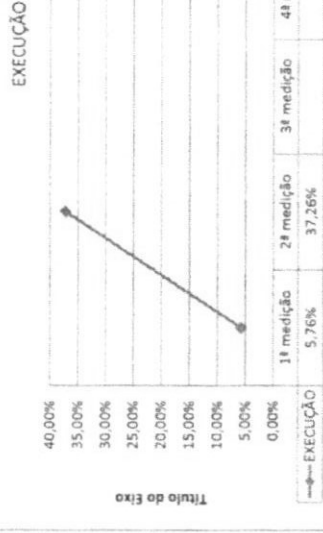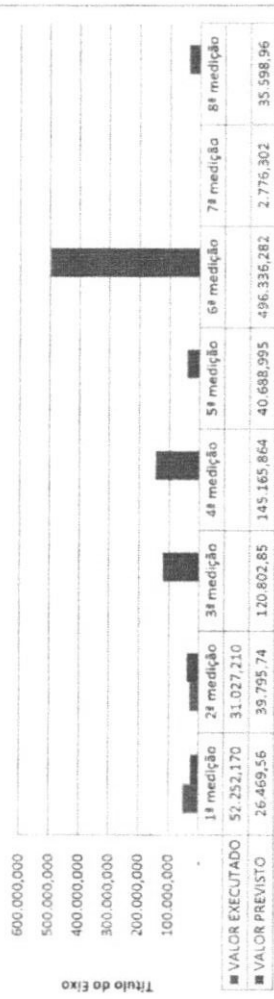

Rodrigo Saltonst & Sá
Arquiteto e Urbanista
C.R.Nº A37175-0

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA

Nota de Liquidação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49

Município: Rondolândia

Data: 10/12/2015

Nº da Liquidação: 2896/15

Global

Processo: AF-1520/2015

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Funcional: 27.812.0115 - ESPORTE E LAZER-INCENTIVO E INFRAESTRUTURA ESPORTI
Projeto/Atividade: 1.120 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS/GINÁSIOS E QUADR
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.0022 - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000072
Nº Docto. Fiscal: 000160
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	2681/15	Liquidações Anteriores:	31.351,27
Valor do empenho:	508.056,20	Valor da liquidação:	31.027,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	508.056,20	Total (B):	62.378,48
		Saldo (A - B):	445.677,72

Crédito: 499 MX DA SILVA COMERCIO DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
Endereço: Rua TIRADENTES, 3155 Cidade: São Francisco do Gua UF: RO
C.N.P.J.: 17-908-058/0001-30 Inscr. Est./Ident. Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRAO PARA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM VESTIARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 31.027,21

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 31.027,21 (trinta e um mil vinte e sete reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número: 23/2015 Data: 10/06/2015
Contrato: Data:

Declara para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável: Data: 10/12/2015

BETT SABAH MARINHO DA SILVA
Prefeita Municipal

JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER
CRC MT 6612/O-4

GERSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Sec de Finanças





14/12/2015 00:41:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 00.41.42
0951200951 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RONDOLANDIA-PAC I
AGENCIA: 0951-2 CONTA: 58.036-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM RONDOLANDIA-PAC I
BANCO: 097 - CC Centralcredi
AGENCIA: 0002-7 - JICRED
CONTA: 60.494-1

FAVORECIDO: M X DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE
CPF/CNPJ: 17.908.058/0001-30
VALOR: R\$ 31.027,21
DEBITO EM: 11/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 4.C45.CD4.F78.2C8.F4C

Transação efetuada com sucesso por: J8711674 GERSON MARINHO DA SILVA JUNIOR.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA

Data: 11/12/2015
N. da Ordem: 3758/15
Parcial
Processo:
Nº AF/Ano: 1520/2015
Vencimento: 06/10/2015

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
C.N.P.J. 04.221.486/0001-49
Município: Rondolândia

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Funcional: 27.812.0115 - ESPORTE E LAZER-INCENTIVO E INFRAESTRUTURA ESPORTI
Projeto/Atividade: 1.120 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS/GINÁSIOS E QUAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.0022 - Obras E Instalações
Cod. Detalham.: 0 - Transferências de Convênios - Educação
Recurso: 0022 - Transferências de Convênios - Educação

Número do empenho: 2681	Pagamentos anteriores: 31.351,27
Valor do empenho: 508.056,20	Valor da ordem: 31.027,21
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 508.056,20	Total (B): 62.378,48
	Saldo (A - B): 445.677,72

Credor: **499 MX DA SILVA COMERCIO DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME**
Endereço: Rua TIRADENTES, 3155 Cidade: São Francisco do Gua UF: RO
C.N.P.J.: 17.908.058/0001-30 Inscr. Est./Ident. Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRAO PARA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM VESTIARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Fonte de recursos - Vinculados Total geral: 31.027,21

Fica autorizado o pagamento de 31.027,21 (trinta e um mil vinte e sete reais e vinte e um centavos)

Contabilização Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/12/2015.

GERSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Sec de Finanças

De: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 31.027,21

Recursos
Conta Banco Núm Docto Valor
46293 B.B. FNDE/PAC-I - 58.036-8 - 58.036-8 121101 31.027,21

Ordem de pagamento Em 11/12/2015 pague-se a importância acima processada

BETT SABAH MARINHO DA SILVA
Prefeita Municipal

Recibo Em 11/12/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

JULIANO MARTINS DA COSTA SWF
CRC MT 6612/O-4





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 14/04/16
Nº da Liquidação: 28/16

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 04.221.456/0001-49

Município: Rondolândia

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Funcional: 27.812.0115 - ESPORTE E LAZER-INCENTIVO E INFRAESTRUTURA ESPORTI
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações
Recurso: 0022 - Transferências de Convênios - Educação

Número do empenho anterior:	0002681/15	Liquidações Anteriores:	0.00
Valor do empenho anterior:	445.677,72	Valor da liquidação:	44.114,32
Valor Anulado:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A):	445.677,72	Total (B):	44.114,32
		Saldo (A - B):	401.563,40

Credor: 499 MX DA SILVA COMERCIO DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME

Endereço: Rua TIRADENTES, 3155

Cidade: São Francisco do Gua

C.N.P.J.: 17.908.058/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RO

Especificação: 1

RESERVA DE DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM VESTIÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 44.114,32

Liquidação

Fica liquidada a importância de 44.114,32 (quarenta e quatro mil cento e quatorze reais e trinta e dois centavos)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data: 14/04/16

BETT SABAH MARINHO DA SILVA
Prefeita Municipal

GERSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER
CRC MT 6612/O-4



3ª MEDIÇÃO

PERÍODO:

10/12/2015

Á

10/04/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

FISCAIS: AROZ RODRIGO SELHORST E SILVA

CAU/BR A3.7.1-A

CONTRATO Nº: 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 122,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			3ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL	
		UND	QTDE	UNITARIO	QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	VALOR A EXECUTAR
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO	m²	12,00	316,51	3.798,12	-	12.000	3.798,12
1.2	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER	m²	3,00	210,99	632,97	-	3.000	632,97
1.3	Locação de construção com qabano de madeira	m²	861,56	8.534,1	7.352,63	-	861,560	7.352,63
1.4	Locação provisória de esqoto	un	1,00	2153,73	2.153,73	-	1.000	2.153,73
1.5	Locação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.285,02	1.285,02	-	1.000	1.285,02
1.6	Locação provisória de água	un	1,00	2153,73	2.153,73	-	1.000	2.153,73
SUBTOTAL					17.376,20			17.376,20
02 - MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³	54,00	48.443	2.615,92	-	54.000	2.615,92
2.2	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	295,00	48.443	14.290,69	-	295.000	14.290,69
2.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	m³	37,40	17.418	651,43	-	37.400	651,43
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	15,00	21.266,5	319,00	-	15.000	319,00
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	15,00	20.042	309,63	-	15.000	309,63
SUBTOTAL					18.186,65			18.186,67
03 - INFRAESTRUTURA								
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:5CM PREPARO MEC	m²	15,00	22.578	338,68	-	15.000	338,68
3.1.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	26,60	31.550	839,23	-	26.600	839,23
3.1.3	CONCRETO ARMADO FCC 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	6,30	516.418	3.253,44	-	6.300	3.253,44
3.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	260,60	31.550	8.221,90	-	260.600	8.221,90

3ª MEDIÇÃO

PERÍODO:

10/12/2015

Á 10/04/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVÁ ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

FISCAIS: AROE RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUJER A37-3-A

CONTRATO Nº. 017/2015

PERÍODO MEDIDO: 122,00

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.ME

Item	UNID	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			3ª medição			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		VALOR A EXECUTAR
			QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR		
3.2.2	m³	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	34,30	516,418	17.713,14	-	-	34,300	17.713,14	-	-
3.2.3	m²	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	72,00	8,522	613,55	-	-	72,000	613,55	-	-
SUBTOTAL					30.979,94				30.979,94		
04		SUPERESTRUTURA									
4.1.1	m²	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	185,50	31,550	5.852,50	-	-	185,500	5.852,50	-	-
4.1.2	m³	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	18,00	516,418	9.295,52	-	-	18,000	9.295,52	-	-
4.2.1	m²	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	110,00	31,550	3.470,50	80,000	2.524,000	80,000	2.524,00	30,00	946,50
4.2.2	m³	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	7,50	516,418	3.873,14	5,000	2.582,090	5,000	2.582,09	2,50	1.291,05
4.3.1	m²	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive cabeamento e escoamento	88,60	89,539	7.933,17	88,600	7.933,170	88,600	7.933,17	-	-
SUBTOTAL					30.424,83			377,10	28.187,28		2.237,55
5		VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA									
5.1	m2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24) CM E=0,09	331,00	51,242	16.961,10	300,000	15.372,600	331,000	16.961,10	83,00	8.384,84
5.2	m2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24) CM E=0,19	183,00	101,022	18.487,04	100,000	10.102,200	183,000	18.487,04	28,00	1.704,51
5.3	m²	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17) CM E=0,04	28,00	60,876	1.704,51	-	-	-	-	-	-
5.4	m²	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1,3 ANTI-CHUVA	6,00	116,241	697,45	-	-	-	-	6,00	697,45
5.5	m²	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1,3 ANTI-CHUVA	148,10	116,241	17.215,29	-	-	-	-	148,10	17.215,29
SUBTOTAL					55.065,39		25.474,80		27.063,30		28.002,09
06		COBERTURA									
6.1	m³	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VAO DE 25,8 m	1.114,00	125,92461	140.280,01	-	-	-	-	1.114,00	140.280,01
SUBTOTAL					140.280,01				1.114,00		140.280,01



PERÍODO: 10/12/2015 Á 10/04/2016

ORDEN DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAL: ANTONIO RODRIGO SELHORST E SILVA

PERÍODO MEDIDO: 122,00

CAUBR A37-75-A

Prefeitura de Rondolândia - MT

3ª MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			3ª medição			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
		UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
6.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	m²	1.114,00	35,83566	39.920,93				1.114,00	39.920,93
	SUBTOTAL				180.200,94					180.200,94
7	ESQUADRIAS									
7.1	PORTA DE MADEIRA 1,00X2,10 INCLUSIVE FERRAGENS	un	2,00	595,024	1.190,05				2,00	1.190,05
7.2	PORTA DE MADEIRA 0,90X2,10 INCLUSIVE FERRAGENS	un	1,00	472,973	472,97				1,00	472,97
7.3	PORTA DE MADEIRA BANHEIRO 0,60M	un	4,00	434,289	1.737,16				4,00	1.737,16
7.4	PORTA DE MADEIRA BANHEIRO 0,80M	un	2,00	453,281	906,56				2,00	906,56
	SUBTOTAL				4.306,74					4.306,74
8	REVESTIMENTOS									
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	960,10	5,047980	4.846,57	300,000	1.514,390	300,000	660,10	3.332,18
8.2	SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	m²	409,10	23,590560	9.650,90				409,10	9.650,90
8.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:7	m²	551,00	13,619550	7.504,37	300,000	4.085,870	300,000	251,00	3.418,50
8.4	REBOCO C/ ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA	m²	328,00	35,023485	11.487,70				328,00	11.487,70
8.5	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEIV 20X20CM	m²	81,10	68,964855	5.564,67				81,10	5.564,67
	SUBTOTAL				39.084,21		5.600,26	600,00	1.729,30	33.483,95
9	PISOS									
9.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m²	633,20	502,386465	318.111,11				633,20	318.111,11
9.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4	m²	633,20	53,016285	33.569,91				633,20	33.569,91
9.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm INCLUS POLIMENTO INTERNO	m²	195,40	96,086550	18.775,31				195,40	18.775,31
9.4	JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO ADAMANTADO	m²	627,05	10,020990	6.283,66				627,05	6.283,66



3ª MEDIÇÃO

PERÍODO:

10/12/2015

Á 10/04/2016

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015
Prazo: 240 dias

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

FISCAL: AIRTON RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUIBA A37-75-A

PERÍODO MEDIDO: 172,00

CONTRATO Nº. 017/2015
CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Item	PLANILHA CONTRATADA			3ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
	UNID	QTDE	UNITARIO	QTDE	VALOR EXECUTADO	QTDE	VALOR ACUMULADO	VALOR A EXECUTAR
9.5	m²	62,50	53,478000					3.342,41
SUBTOTAL					380.082,40			380.082,40
10	PINTURA							
10.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	847,20	2.62395			847,20	2.223,01
10.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA	m	360,00	9,14634			360,00	3.292,68
10.3	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO 2 MAOS	m²	88,60	9,59616			88,60	850,22
10.4	ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	m²	1.114,00	16,29348			1.114,00	18.150,94
10.5	50 MICRA C/REVOLVER	m²	1.114,00	8,02179			1.114,00	8.936,77
10.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO 2 DEMAOS DE TINTA ACRILICA	m²	847,20	17,84286			847,20	15.116,47
10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	m²	480,00	11,54536			480,00	5.541,78
10.8	PINTURA EM TINTA PVA LATEX 2 DEMAOS	m²	476,00	11,72031			476,00	5.578,87
SUBTOTAL					59.690,24			59.690,24
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
11.1	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 20MM	UN	4,00	11,870			4,00	47,48
11.2	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 25MM	UN	12,00	14,069			12,00	168,83
11.3	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 32MM	UN	4,00	22,553			4,00	90,21
11.4	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 50MM	UN	4,00	31,000			4,00	124,00
11.5	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50MM - 40MM	UN	2,00	2,337			2,00	4,67
11.6	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40MM - 25MM	UN	2,00	0,612			2,00	1,22
11.7	CAIXA DE AGUA FIBRA DE VIDRO CAP 3000 LITROS	UN	1,00	1639,032			1,00	1.639,03
11.8	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO	UN	10,00	6,365			10,00	63,85



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016

Prefeitura de Rondolândia - MT



3ª MEDIÇÃO

PERÍODO: 10/12/2015 À 10/04/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAL: AVDR RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUIBR A3775-A

CONTRATO Nº: 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 122,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			3ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
		UNO	QTDE	UNITARIO	VALOR EXECUTADO	QTDE	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
11 9	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25MM	UN	3,00	15 644	46 93			3,00	46 93
11 10	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UN	2,00	42 108	84 22			2,00	84 22
11 11	JOELHO 90º SOLDAVEL 25MM	UN	11,00	6 310	69 41			11,00	69 41
11 12	JOELHO 90º SOLDAVEL 32MM	UN	6,00	7 135	42 81			6,00	42 81
11 13	JOELHO 90º SOLDAVEL 50MM	UN	8,00	11 358	90 86			8,00	90 86
11 14	JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 29MM 1/2"	UN	2,00	8 222	16 44			2,00	16 44
11 15	JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 32MM 25MM	UN	4,00	8 222	32 89			4,00	32 89
11 16	JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25MM 1/2"	UN	4,00	7 072	28 29			4,00	28 29
11 17	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 40MM - 32MM	UN	16,00	2 899	46 38			16,00	46 38
11 18	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50MM - 20MM	UN	4,00	6 597	26 39			4,00	26 39
11 19	LUVA SOLDAVEL 32MM	UN	2,00	8 497	16 99			2,00	16 99
11 20	LUVA SOLDAVEL SOLDAVEL COM ROSCA 3/4"	UN	8,00	4 596	36 77			8,00	36 77
11 21	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPIA CROMADA 1"	UN	2,00	75 557	151 11			2,00	151 11
11 22	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPIA CROMADA 1 1/2"	UN	2,00	113 242	226 48			2,00	226 48
11 23	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPIA CROMADA 1/2"	UN	2,00	60 370	120 75			2,00	120 75
11 24	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPIA CROMADA 3/4"	UN	2,00	65 849	131 70			2,00	131 70
11 25	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPIA CROMADA 3/4"	UN	5,00	62 975	314 85			5,00	314 85
11 26	TE 90º SOLDAVEL 25MM	UN	8,00	7 147	57 18			8,00	57 18
11 27	TE 90º SOLDAVEL 40MM	UN	8,00	7 147	57 18			8,00	57 18
11 28	TE 90º SOLDAVEL 50MM	UN	4,00	18 143	72 57			4,00	72 57
11 29	TE DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL 32MM - 25MM	UN	4,00	12 358	49 43			4,00	49 43
11 30	TE DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL 50MM - 40MM	UN	2,00	28 201	56 40			2,00	56 40
11 31	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2"	UN	8,00	14 907	119 26			8,00	119 26
11 32	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA EM PVC D=3/4"	UN	1,00	63 037	63 04			1,00	63 04
11 33	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	UN	27,00	13 445	363 02			27,00	363 02
11 34	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	UN	38,00	15 931	605 38			38,00	605 38
11 35	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	UN	28,00	21 454	600 71			28,00	600 71
11 36	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	UN	14,00	26 627	372 78			14,00	372 78
11 37	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	UN	36,00	31 462	1 132 63			36,00	1 132 63
11 38	UNIAO SOLDAVEL 20MM	UN	6,00	4 911	29 47			6,00	29 47
11 39	UNIAO SOLDAVEL 50MM	UN	2,00	22 928	45 86			2,00	45 86
11 40	VASO SANITARIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	2,00	226 634	453 27			2,00	453 27
11 41	VASO SANITARIO SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00	226 634	906 54			4,00	906 54

Eng. Emp

Fiscal

Fiscal 5/11



3ª MEDIÇÃO

PERÍODO:

10/12/2015 Á 10/04/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

FISCAIS: AROF RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUBR A37-75-A

PERÍODO MEDIDO: 122,00

Item	DESCRÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA		3ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		VALOR A EXECUTAR		
		UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO		VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR
SUBTOTAL					8.831,48				314,00	8.831,48
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS									
12.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM	UN	5,00	3,449	17,25				5,00	17,25
12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60)CM	UN	4,00	137,782	551,13				4,00	551,13
12.3	CAIXA SIFONADA (100X100X50)MM	UN	6,00	40,571	243,43				6,00	243,43
12.4	CAIXA SIFONADA (150X150X50)MM	UN	4,00	41,196	164,78				4,00	164,78
12.5	CURVA 90º CURTA 40MM	UN	14,00	7,210	100,94				14,00	100,94
12.6	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO D=2,50XH12)	UN	1,00	1281,075	1.281,08				1,00	1.281,08
12.7	JOELHO 45º 40MM	UN	3,00	9,496	28,49				3,00	28,49
12.8	JOELHO 45º 50MM	UN	6,00	11,233	67,40				6,00	67,40
12.9	JOELHO 90º 100MM	UN	7,00	20,867	146,07				7,00	146,07
12.10	JOELHO 90º COM ANEL P/ESGOTO SEC 40MM	UN	10,00	9,321	93,21				10,00	93,21
12.11	JUNÇÃO SIMPLES 100MM 100MM	UN	5,00	28,326	141,63				5,00	141,63
12.12	JUNÇÃO SIMPLES 100MM- 50MM	UN	8,00	22,291	178,33				8,00	178,33
12.13	JUNÇÃO SIMPLES 50MM- 50MM	UN	9,00	13,819	124,37				9,00	124,37
12.14	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATORIO 1" - 1 1/2"	UN	1,00	19,892	19,89				1,00	19,89
12.15	SUMIDOURO EM ALVENARIA D=2,30XH=6	UN	1,00	1450,307	1.450,31				1,00	1.450,31
12.16	TE SANITARIO 100MM - 50MM	UN	1,00	34,988	35,00				1,00	35,00
12.17	TUBO PVC PONTA E BOLSA C/ VIROLA - 50MM	M	3,00	29,351	88,05				3,00	88,05
12.18	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM	M	35,00	46,881	1.640,82				35,00	1.640,82
12.19	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM	M	20,00	23,778	475,56				20,00	475,56
12.20	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM	M	17,00	32,067	545,48				17,00	545,48
12.21	VALVULA PARA LAVATORIO E TANQUE 1"	UN	9,00	5,173	46,56				9,00	46,56
SUBTOTAL					7.540,52				72,00	7.540,52
13	DRENAGEM PLUVIAL									
13.1	GALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 24	m	72,00	63,225	4.552,17				72,00	4.552,17
13.2	TUBO DE QUEDA AGUA PLUVIAL DN 150MM	m	20,00	32,937	658,74				20,00	658,74
13.3	JOELHO PVC 90º Ø=150MM TUBULACAO PLUVIAL	UN	4,00	22,056	88,26				4,00	88,26
13.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI COM TELA DE ACO COM FUNIL DE SAIDA CONICO	UN	4,00	94,325	377,30				4,00	377,30
